

裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备 改造提升项目绩效评价报告

(2022年度)


项目名称：裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱
生产线设备改造提升项目

项目单位：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府


主管部门：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

委托单位：裕民县财政局

评价机构：北京用友政务软件股份有限公司

主评人：

复审人：

终审人：



二〇二三年七月

目录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 4 -
二、绩效评价工作的开展情况	- 6 -
(一) 评价目的、对象和范围	- 6 -
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等	- 6 -
(三) 绩效评价工作过程	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)	- 11 -
四、绩效评价指标分析	- 14 -
(一) 项目决策情况(分值12分, 得11分)	- 14 -
(二) 项目过程情况(分值18分, 得18分)	- 15 -
(三) 项目产出情况(分值40分, 得38分)	- 17 -
(四) 项目效益情况(分值30分, 得28.83分)	- 22 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 24 -
(一) 主要经验及做法	- 24 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 24 -
六、有关建议	- 24 -
七、其他需要说明的问题	- 25 -
附件一: 综合评分表	- 26 -
附件二: 满意度调查问卷报告	- 42 -
附件三: 调查问卷的分析	- 46 -

附件四：项目现场照片 - 48 -
附件五：项目验收单 - 53 -

裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线 设备改造提升项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《2022年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》文件要求，促进预算绩效管理工作，提高财政资源配置效率和使用效益，塔城地区裕民县财政局委托第三方评价机构——北京用友政务软件股份有限公司（以下简称我公司），对裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目进行绩效评价。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、访谈、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

经综合评价，该项目总体得分95.83分，评价等级为“优”。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

食品工业是“为耕者谋利，为食者造福”的传统民生产业，在实施制造强国战略和推动健康中国建设中具有重要地位。为了食品工业的规范发展，2017年1月国家发改委和工信部发布了《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，对食品生产环节和市场流通体系等环节进行规范，确保生产准入和流通规范运

行体系的建立和执行。国家产业政策的支持，为行业的发展提供了有利条件。因此，实施阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目是顺应国家政策而为，对稳定农民收入，增加就业，具有很好的现实意义。因此，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府基于此背景下于2022年6月提出《关于申请办理阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目立项的报告》（阿政发〔2022〕43号），2022年6月26日裕民县乡村振兴领导小组办公室下达《裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目的批复》（裕乡振项目〔2022〕63号），项目总投资安排预算281万元，资金来源为2022年中央衔接补助资金。

2.项目主要内容及实施情况

（1）主要内容

购置全套饮品及果酱生产线相关配套附属设施。购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、消毒锅、过滤机、传送带等。

（2）项目实施情况

截至2022年12月31日，项目已完成内容包括：1、前处理设备单元（1.已完成购置自动灌装线1套、2.全自动打浆蒸煮一体机1台、3.洗瓶旋盖消毒机1台）；2、灌装包装设备单元（1.储蓄罐1台、2.包装机1个、3.喷码机1个、4.上瓶机1个、5.蒸煮锅1个、6.消毒锅1个、7.过滤机1个、8.传送带1条等。）

(3) 评价时段

本专项资金的评价时段为2022年1月1日—2022年12月31日。

3. 资金投入和使用情况

该项目预算总投资281万元。2022年5月20日，裕民县财政局下达《转发自治区财政厅关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（裕财振〔2022〕1号）项目资金281万元，资金到位率100%，截至2022年12月31日，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府向裕民县天洁绿色能源器材销售有限公司支付项目款281万元用于采购全套饮品及果酱生产线设备，支付率100%。

4. 项目组织与管理情况

(1) 项目资金的组织情况：

该项目资金拨付部门为裕民县财政局，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府为项目主管部门，项目中标单位为裕民县天洁绿色能源器材销售有限公司。

裕民县财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府：组织编制项目资金绩效目标和年度预算；参与组织项目资金的申报、审核及验收工

作，配合裕民县天洁绿色能源器材销售有限公司完成项目的其他工作。

（2）资金管理情况

本项目资金由裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府依据规定使用，依照项目资金管理办法，规范财务管理，确保资金专款专用，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料的手续，根据项目实际实施进度支付资金。

（二）项目绩效目标

1.总目标

该项目旨在促进区域经济协调发展，全面改善农村项目产业配套建设，推动产业发展壮大，提高农民收入、提升农民生活品质。为使该项目顺利实施现采取以下目标：

（1）优化产业结构，提升产品品质。购置设备单元1个，升级灌装包装设备单元，采用先进技术和设备，更好满足食品消费升级需求。

（2）推进绿色制造，加强环境保护。探索资源节约和环境友好的食品工业可持续发展模式，提高垃圾处理率，强化资源循环利用。

（3）加强人才队伍建设。设立专业小组，由其时常开展培训，提升非专业人员的专业性，在增加就业人数的前提下保障团队的专业性。

2.阶段性目标

根据该项目资金的相关政策文件、资金文件、主管部门工作计划等相关资料，对2022年本项目绩效目标进行梳理，具体绩效目标如表1-1所示：

表1-1：裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	购置自动灌装线	=1套
		购置自动打浆蒸煮一体机	=1台
		购置洗瓶旋盖消毒机	=1台
		购置储蓄罐	=1台
		购置包装机	=1个
		购置喷码机	=1个
		购置上瓶机	=1个
		购置蒸煮锅	=1个
		购置消毒锅	=1个
		购置过滤机	=1个
		购置传送带	=1条
	质量指标	设备采购质量合格率	=100%
	时效指标	设备购置完成时间	2022年10月31日
资金支付及时率		=100%	
成本指标	前处理设备单元	≤178.90万元	
	灌装包装设备单元	≤102.10万元	
效益指标	经济效益	带动村集体收入	≥8.40万元
	社会效益	受益人口数	≥2158人
	可持续影响效益	设备使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥90%

二、绩效评价工作的开展情况

（一）评价目的、对象和范围

评价目的：本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

评价对象和评价范围：对2022年裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府资金、项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价通过现场调研，评价小组对资金的到位、使用、管理情况以及项目绩效情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次绩效评价遵循科学公正、统筹、兼顾、激励约束、公开透明的原则按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的评价。

2.绩效评价指标体系

（1）指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑

辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

（2）指标解释

权重：本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

3.评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘察法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府项目资金建设相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的制定方、实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地勘察法：实地查看裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目所采购的自动灌装线、全自动打

浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、消毒锅、过滤机、传送带等配套工程使用情况等。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况、实现程度和效果。

评价标准：本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

指标体系：根据《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件一。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

本次评价委托方为裕民县财政局，受托方为北京用友政务软件有限公司。北京用友政务软件有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。

2.成立评价工作组

本次项目的评价期间为2023年7月1日至2023年7月30日，北京用友政务软件有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次裕民县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表2-1：评价组组长表

序号	姓名	本评价工作中角色	工作职责
1	周扬	项目顾问	负责绩效评价过程指导
2	蒋秀兰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	姬嘉欣	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	马艳	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

3.评价进度

本次评价时间从2023年7月1日开始，到2023年7月30日结束，分为三个阶段：

（1）评价准备阶段（2023年7月1日—2023年7月5日）。主要工作内容包括：①认真学习《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号、《2022年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作的规划》的相关要求与规定成立项目组，制定科学合理的工作实施方案，明确工作方法和步骤。同时通过相关基础资料，了解资金管理使用和项目实施概况。②收集项目相关政策文件、资金拨付明细等资料。③根据评价范围、评价对象及实施单位的情况，制定绩效评价工作方案。其中明确了评价思路、评价方法、指标体系、调研安排等内容。方案在与委托方确认后，形成文件下发至相关单位。

（2）组织实施阶段（2023年7月5日—2023年7月10日）。主要工作内容包括：在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

（3）报告撰写阶段（2023年7月10日—2023年7月30日）。主要工作内容包括：①撰写报告。根据审核资料和线上调查情况对评价指标进行打分，对照打分情况对项目的决策、管理和绩效情况进行分析，对项目实施存在的问题及改进建议形成共识，结合评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。②提交报告。针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进

措施，连同报告初稿报送委托方，并根据委托方的意见进一步修改完善报告。③修改报告。根据委托方反馈意见修改评价报告，提交正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

运用由评价组按相关规定编制并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2022年裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为95.83分，各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件一。

表3-1：项目指标得分情况汇总

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	12	11.00	91.67%
项目过程	18	18.00	100.00%
项目产出	40	38.00	95.00%
项目效益	30	28.83	96.10%
合计	100	95.83	95.83%

表3-2：项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
项目决策（12分）	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		项目立项规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	项目目标(6分)	项目目标合理性	6	合理	基本合理	5	83.33%
项目管理（18分）	投入管理(6分)	预算编制合理性	3	合理	合理	3	100.00%
		预算执行率	3	=100%	100.00%	3	100.00%
	财务管理(4分)	财务管理制度健全性	2	健全	健全	2	100.00%
		资金使用合规性	2	合规	合规	2	100.00%
	项目实施(8分)	管理制度健全性	4	健全	健全	4	100.00%
		管理制度执行有效性	2	有效	有效	2	100.00%
		合同管理完备性	2	完备	完备	2	100.00%
项目产出（40分）	产出数量（30分）	购置自动灌装线	3	=1套	=1套	3	100.00%
		购置自动打浆蒸煮一体机	3	=1台	=1台	3	100.00%
		购置洗瓶旋盖消毒机	3	=1台	=1台	3	100.00%
		购置储蓄罐	3	=1台	=1台	3	100.00%
		购置包装机	3	=1个	=1个	3	100.00%
		购置喷码机	3	=1个	=1个	3	100.00%

项目效益(30分)		购置上瓶机	3	=1个	=1个	3	100.00%	
		购置蒸煮锅	3	=1个	=1个	3	100.00%	
		购置消毒锅	2	=1个	=1个	2	100.00%	
		购置过滤机	2	=1个	=1个	2	100.00%	
		购置传送带	2	=1条	=1条	2	100.00%	
	产出质量 (2分)	设备采购质量合格率	2	=100%	100%	2	100.00%	
	产出时效 (4分)	设备购置完成时间	2	2022年10月31日	2023年4月19日	0	0.00%	
		资金支付及时率	2	=100%	100%	2	100.00%	
	产出成本 (4分)	前处理设备单元	2	≤178.90万元	178.90万元	2	100.00%	
		灌装包装设备单元	2	≤102.10万元	102.10万元	2	100.00%	
	经济效益 (7分)	带动村集体收入	7	≥8.40万元	6.996万元	5.83	83.29%	
	社会效益 (7分)	受益人口数	7	≥2158人	2158人	7	100.00%	
	可持续影响效益 (6分)	设备使用年限	6	≥10年	10年	6	100.00%	
	满意度指标 (10分)	受益人口满意度	10	≥90%	95%	10	100.00%	
	总分			100	-	-	95.83	95.83%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（分值12分，得11分）

1、项目立项方面（分值6分，得6分）

（1）立项依据充分性（分值3分，得3分）

本项目主体要依据《裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目的批复》（裕乡振项目〔2022〕63号）；立项依据充分性达到100%，立项程序规范化达到100%，项目完全按照财政相关文件和要求实施。

该指标分值3分，依据评分标准，此项指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性（分值3分，得3分）

该项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县相关政策进行研究、集体决策等，项目立项符合规定程序，立项文件和审批文件完整，项目程序合规。

该指标分值3分，依据评分标准，此项指标不扣分，得3分。

2、项目目标合理性（分值6分，得5分）

绩效目标总体设置不合理，绩效目标不够明确，难以衡量一是数量指标设置较少，不能充分体现该项目的具体采购内容；二是该项目为采购类项目，时效指标设置的为“项目（工程）完成及时率”，该指标为工程类项目指标，与该项目无关，

应设置为“设备采购质量合格率”指标；三是生态效益指标的三级指标“垃圾处理率”，该指标无法具体描述，不应用在该项目。

该指标分值6分，依据评分标准，此项指标扣1分，得5分。

（二）项目过程情况（分值18分，得18分）

1、投入管理情况（分值6分，得6分）

（1）预算编制合理性（分值3分，得3分）

资金管理办法健全，项目支出规范。裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府制定了《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府预算管理内部控制制度》《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府财务管理办法》等相关制度，相关制度中明确了资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内部监管机制；本单位重视财务管理工作，加强会计基础工作规范。预算编制依据充分，资金支出合理合规。

该指标分值3分，依据评分标准，此项指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率（分值3分，得3分）

经查验单位提供的项目开展过程中相关支付凭证得知，安排预算资金281万元，截至2022年12月实际支出281万元，支付率100%。

该指标分值3分，依据评分标准，此项指标不扣分，得3分。

2.财务管理情况（分值4分，得4分）

（1）财务管理制度健全性（分值2分，得2分）

经过查验，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府依据《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府预算管理内部控制制度》《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府收支管理内部控制制度》《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府财务管理办法（试行）》《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府会计档案管理办法》，对本项目进行财务管理，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档，项目实施人员的条件、场地设备、信息支撑落实到位，符合相关制度规。

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

（2）资金使用合规性（分值2分，得2分）

经现场查阅会计支付凭证、资金支付请示等资料，阿勒腾也木勒乡人民政府项目资金的拨付均符合财务管理制度，有完整的审批程序和手续，不存在滞留、占用、挪用等现象。

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

3.项目实施情况（分值8分，得8分）

（1）管理制度健全性（分值4分，得4分）

经查验，阿勒腾也木勒乡人民政府制定了业务管理制度，主要有《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府合同管理内部控制制度》《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府政府采购管理内部控制

制度》《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府建设项目内部管理控制制度》《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府工程招投标管理办法》。

该指标分值4分，依据评分标准，此项指标不扣分，得4分。

(2) 管理制度执行有效性 (分值2分, 得2分)

经现场查阅资料，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府项目实施符合相关管理制度要求，项目实施相关资料齐全，项目支出手续完备，财会核算准确规范。

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

(3) 合同管理完备性 (分值2分, 得2分)

该项目执行符合相关法律法规和相关管理规定，通过公开招标确定施工单位，签订施工合同，档案管理比较规范。同时项目管理、实施人员均落实到位。

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

(三) 项目产出情况 (分值40分, 得38分)

1. 项目产出数量 (分值30分, 得30分)

(1) 购置自动灌装线 (分值2分, 得2分)

截至2022年12月31日，阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置自动灌装线预期指标值=1套，实际完成值1套，指标完成率100%；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

(2) 购置自动打浆蒸煮一体机（分值2分，得2分）

截至2022年12月31日，阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置自动打浆蒸煮一体机预期指标值=1台，实际完成值1台，指标完成率100%；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

(3) 购置洗瓶旋盖消毒机（分值2分，得2分）

截至2022年12月31日，阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置洗瓶旋盖消毒机预期指标值=1台，实际完成值1台，指标完成率100%；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

(4) 购置储蓄罐（分值2分，得2分）

截至2022年12月31日，阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置储蓄罐预期指标值=1台，实际完成值1台，指标完成率100%；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

(5) 购置包装机 (分值2分, 得2分)

截至2022年12月31日, 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置包装机预期指标值=1个, 实际完成值1个, 指标完成率100%;

该指标分值2分, 依据评分标准, 此项指标不扣分, 得2分。

(6) 购置喷码机 (分值2分, 得2分)

截至2022年12月31日, 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置喷码机预期指标值=1个, 实际完成值1个, 指标完成率100%;

该指标分值2分, 依据评分标准, 此项指标不扣分, 得2分。

(7) 购置上瓶机 (分值2分, 得2分)

截至2022年12月31日, 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置上瓶机预期指标值=1个, 实际完成值1个, 指标完成率100%;

该指标分值2分, 依据评分标准, 此项指标不扣分, 得2分。

(8) 购置蒸煮锅 (分值2分, 得2分)

截至2022年12月31日, 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置蒸煮锅预期指标值=1个, 实际完成值1个, 指标完成率100%;

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

（9）购置消毒锅（分值2分，得2分）

截至2022年12月31日，阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置消毒锅预期指标值=1个，实际完成值1个，指标完成率100%；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

（10）购置过滤机（分值2分，得2分）

截至2022年12月31日，阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置过滤机预期指标值=1个，实际完成值1个，指标完成率100%；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

（11）购置传送带（分值2分，得2分）

截至2022年12月31日，阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置传送带预期指标值=1条，实际完成值1条，指标完成率100%；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

2.项目产出质量（分值2分，得2分）

设备采购质量合格率

截至2022年12月31日，项目（工程）验收合格率预期指标值=100%；通过对项目单位提供的竣工验收报告了解到项目施工质量符合设计文件及国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准的要求，资料齐全完整，验收质量评定为合格，故该指标达标。

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

3.项目产出时效（分值4分，得2分）

（1）设备购置完成时间（分值2分，得0分）

截至2022年12月31日，设备购置完成时间预期指标值为2022年10月31日；通过对项目单位提供的项目资料了解到项目设备采购完成日期为2023年4月19日，项目延期170天完成；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指扣2分，得0分。

（2）资金支付及时率（分值2分，得2分）

截至2022年12月31日，根据项目单位提供的的财政直接支付凭证和发票显示，该项目按期支付项目款项，无延期支付或提前支付现象；

该指标分值2分，依据评分标准，此项指不扣分，得2分。

4.项目产出成本（分值4分，得4分）

（1）前处理设备单元（分值2分，得2分）

该项目前处理设备单元所需预期成本为178.90万元，根据项目单位提供的财政直接支付凭证和发票显示，前处理设备单元实际所需成本为178.90万元。

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

（2）灌装包装设备单元（分值2分，得2分）

该项目灌装包装设备单元所需预期成本为102.10万元，根据项目单位提供的财政直接支付凭证和发票显示，灌装包装设备单元实际所需成本为102.10万元。

该指标分值2分，依据评分标准，此项指标不扣分，得2分。

（四）项目效益情况（分值30分，得28.83分）

（1）经济效益（分值7分，得5.83分）

带动村集体收入，指标值： ≥ 8.4 万元；通过查看相关财务数据发现2022年12月30日，江阿布拉克村与裕民县汇河农业发展有限公司签订承包合同，承包期限为2022年12月30日-2025年12月30日，承包金额为104940元/年（合同约定因疫情影响及项目实施实际情况，2023年租金自2023年5月1日-2023年12月31日收取，共计69960元，目前已收租金69960元，收益待分配）。

该指标分值7分，依据评分标准，此项指标扣1.17分，得5.83分。

(2) 社会效益 (分值7分, 得7分)

受益人口数, 指标值: ≥ 2158 人; 据有关资料显示, 此项目的实施带动了当地的产业发展, 使得该项目直接受益人数为2158人, 拓宽了就业范围, 让更多的人参与到建设美丽家园的队伍当中, 解决了农民就业难的问题, 使受益群体不再具有局限性, 从而提高了受益人口, 故该指标达标。

该指标分值7分, 依据评分标准, 此项指标不扣分, 得7分。

(3) 可持续影响力 (分值6分, 得6分)

设备使用年限, 指标值: ≥ 10 年; 评价小组通过现场勘察、查阅项目资料的形式了解到, 该项目建设完全按照实施方案进行, 购置的设备皆符合生产要求, 未发现以次充好的现象, 故该指标达标。

该指标分值6分, 依据评分标准, 此项指标不扣分, 得6分。

(4) 满意度指标 (分值10分, 得10分)

受益人口满意度, 指标值: $\geq 90\%$; 本次满意度调查对象主要为阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目受益人, 评价小组通过对项目成果应用单位发放本次受益人口满意度调查问卷。实际发放问卷100份, 回收问卷100份, 受益对象的整体满意程度90%, 已达到预期目标。

该指标分值10分, 依据评分标准, 此项指标不扣分, 得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府2022年项目整合现有资源，统一规范接口，精简流程。为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中，严格把关，按照项目资金使用规范做好审核工作，让项目资金落于实处。

（二）存在的问题及原因分析

绩效目标合理性有待提升：绩效目标总体设置不合理，绩效目标不够明确，难以衡量。一是数量指标设置较少，没有进行细化，不能充分体现该项目采购的具体内容；二是生态效益指标的三级指标“垃圾处理率”，该指标无法具体描述，不应用量化指标进行描述，应转为定性指标。

六、有关建议

确保目标设置紧贴实际，树牢绩效管理观念，强化目标审核。绩效评价在指标设定上存在偏离的现象，绩效指标设定要从单位实际出发，按照科学、合理、真实的标准进行设定方案。建议项目单位在预算编制层面，严把审核关口，细化量化绩效目标，求真务实，夯实管理职能、丰富监管手段，做好过程管理，及时发现问题整改纠偏；在评价考核层面，正视管理存在的问题，拾遗补缺，不走过场，强化绩效评价结果应用。对绩效目标合理性不足的问题，建议裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府加强项目目标研究，提升目标申报水平。在项目绩效目

标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。

七、其他需要说明的问题

本次评价涉及裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目，相关数据由裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府提供，此报告仅适用于裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目。

附件一：综合评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	标杆 值	评分 依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
项目 决策 (12)	项目 立项 (6)	立项依 据充分 性	3	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用 标准	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占1/3权重，符合的该项权重分，不符合不得分。	①本项目主要依据《关于申请办理阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目立项的报告》（阿政发〔2022〕43号）；②于2022年6月26日下达批复：裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目的批复裕乡振项目〔2022〕63号；③该项目与裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府职责密切相关，故得满分3分。	3.00	100.00%

		项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全的权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。	该项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对新疆维吾尔自治区塔城市相关政策进行研究、集体决策等，项目立项符合规定程序，立项文件和审批文件完整，综上，该项得分3分。	3.00	100.00%
项目目标(9)	项目目标合理性	6	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度	基本合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%	①根据《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府资金绩效目标申报表》等相关材料，该项目设立了总目标和年度目标；②绩效目标合理性有待提升：绩效目标总体设置	5	83.33%	

				目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。			的权重分)；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标 and 总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。	不合理，绩效目标不够明确，难以衡量。一是数量指标设置较少，没有进行细化，不能充分体现该项目采购的具体内容；二是生态效益指标的三级指标“垃圾处理率”，该指标无法具体描述，不应用量化指标进行描述，应转为定性指标。 综上，最后得分5分。		
项目管理(18)	投入管理(6)	预算编制合理性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	合理	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理，先得30%的权重分；②预算编制细化，再得30%的权重分；③再根据2021年各子项的预算执行情况，对预算编制的合理性分五级判断，分别得剩余	①该项目预算编制主要根据新疆现代建设(集团)有限公司裕民分公司编制《裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府资金可行性研究报告》进行测算，预算编制依据充分，先得30%权重；②裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府资金总投资估算表，该项目预算已经细化，包括	3.00	100.00%

						权重分的100%、80%、60%、40%和20%。	阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置全套饮品及果酱生产线相关配套附属设施的使用情况等费用各子项的预算有具体的明细，再得30%权重。③预算编制总体比较合理，各项实际支出与预算金额总体较为匹配，再得40%权重。综上所述，该项得满分。		
	预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况； 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	该项目2022年预算281万元，截至2022年12月支出281万元，预算执行率=281/281*100%=100%，故该项得3分。	3	100%
财务管理 (4)	财务管理制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，	健全	通用标准	考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整	①该项目已制定相应的项目资金管理办法；②相关办法中关于资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容明确，③项	2.00	100.00%

		健全性		用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。			(包括资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容); ③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性; 三项各占20%、40%、40%的权重分, 满足一项得对应权重分。	目资金管理办法明确且可操作性强, 综上, 该项得满分。		
		资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	考察主管部门: ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否	①该项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②该项目资金的拨付和支付的审批手续完整; ③项目的重大开支经过评估认证; ④项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上, 该	2.00	100.00%

						<p>经过评估认证；④是项得满分2分。</p> <p>否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得60%的权重分，②③中每满足一项再得20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目 实施 (8)	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察主管部门①是否已制定或具有项目实施方案；②项目实施方案是否完整（实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等）；以上两项各占50%的权重分，满足一项得对应的权重分。	根据新疆现代建设（集团）有限公司裕民分公司编制《可行性研究报告》，该项目已经制定了完整的实施方案；②项目实施方案完整。综上，该项得满分4分。	4.00	100.00%
	管理制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	考察上述管理制度的执行情况，每项制度占1/9权重分，各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；③落实了工作开展的人员条件、场	根据访谈调研本项目实施内容，该项目遵守相关法律法规和业务管理规定执行情况良好；资料保存较完整，该项得满分2分。	2.00	100.00%

						地设备、信息支撑等，三项分别占剩余权重分的1/3，各环节满足一项得对应的权重分，否则扣除对应权重分。			
		2	考察本项目合同管理的完备性。	完备	计划标准	考察①按规定签署相关合同、协议；②合同标的物及价格明确；③合同中有明确的质量标准或验收标准；④合同有明确的交付方式及地点；⑤合同履约期限明确；⑥合同支付方式和支付时间明确；⑦合同违约责任界定明确；以上各占1/7的	依据项目合同等相关材料，该项目①按规定签署相关合同及协议；②合同标的物及价格明确；③合同中有明确的质量标准或验收标准；④合同有明确的交付方式及地点；⑤合同履约期限明确；⑥合同支付方式和支付时间明确；⑦合同违约责任界定明确；综上所述，该项目得满分2分。	2.00	100.00%
		合同管理完备性							

							权重分，满足则得对应的权重分，否则不得分。			
项目产出 (40)	产出数量 (30)	购置自动灌装线	3	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1套	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	3	100.00%
		购置自动打浆蒸煮一体机	3	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1台	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	3	100.00%

		购置洗瓶旋盖消毒机	3	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1台	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	3	100.00%
		购置储蓄罐	3	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1台	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	3	100.00%
		购置包装机	3	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置	=1个	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装	3	100.00%

			设备完成情况。				机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。		
	购置喷码机	3	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1个	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	3	100.00%
	购置上瓶机	3	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1个	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	3	100.00%

		购置蒸煮锅	3	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1个	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	3	100.00%
		购置消毒锅	2	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1个	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	2	100.00%
		购置过滤机	2	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置	=1个	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装	2	100.00%

			设备完成情况。				机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。		
	购置传送带	2	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目购置设备完成情况。	=1条	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和实地考察，截至目前，该项目以购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、过滤机、传送带等相关配套设施。故该指标得满分。	2	100.00%
产出质量 (2分)	设备采购 质量合格 率	2	考察阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目工程质量验收情况。	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	通过对项目单位提供的竣工验收报告了解到该项目购置的果酱生产线设备及配套实施均达到验收标准，故该指标已完成。得满分。	2	100.00%
产出 时效 (4	设备购置 完成时间	2	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备	2022年 10月31 日	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为	根据项目验收资料和会计凭证，该项目于2023年4月19日验收，项	0	0.00%

分)			改造提升项目是否在约定时间内完成设备的购置。			止。	目延期5个月余19日，未在规定时间内完成该指标。故该指标得0分。		
资金支付及时率	2	考察阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目是否在约定时间内完成项目的建设。	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣		截至2022年12月31日，根据项目单位提供的的财政直接支付凭证和发票显示，该项目按期支付项目款项，无延期支付或提前支付现象；	2	100.00%
产出成本 (4分)	前处理设备单元	2	考察阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目该指标所需成本。	≤178.90万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣	根据项目验收资料和会计凭证，该指标所需金额178.90万元未超出预期成本，故该指标得2分。	2	100.00%
	灌装包装设备单元	2	考察阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提	≤102.10万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣	根据项目验收资料和会计凭证，该指标所需金额102.10万元未超出预期成本，故该指标得2分。	2	100.00%

				升项目该指标所需成本。						
产出效益(30分)	经济效益(7分)	带动村集体收入	7	考察阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目能为村集体所带来的收益。	≥8.40万元	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	2022年12月30日，江阿布拉克村与裕民县汇河农业发展有限公司签订承包合同，承包期限为2022年12月30日-2025年12月30日，承包金额为104940元/年（合同约定因疫情影响及项目实施实际情况，2023年租金自2023年5月1日-2023年12月31日收取，共计69960元，目前已收租金69960元，收益待分配），该项得分5.83分	5.83	83.29%
	社会效益(7分)	受益人口数	7	考察阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目受益的人数。	≥2158人	计划指标	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。	根据项目验收资料和会计凭证以及现场调研等程序得知，项目建成后针对周边的居民来说，增加了当地居民的收益。该项得分7分。	7	100.00%

可持续影响效益(6分)	设备使用年限	6	考察该项目所购置的相关设备及配套设施的使用年限	≥10年	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低1%扣除5%的权重分, 扣完为止。	根据项目验收资料和现场调研得知, 该项目设备由裕民县天洁绿色能源器材销售有限公司提供, 由裕民县阿勒腾也木勒乡项目办同裕民县乡村振兴局、裕民县财政局、村组代表和裕民县天洁绿色能源器材销售有限公司等相关单位共同验收, 故该指标得6分	6	100%
受益人口满意度(10分)	受益人口满意度	10	考察裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目受益人员满意度。	≥90%	计划标准	达到目标值得满分, 低于则每降低1%扣除5%的权重分, 扣完为止。	本次满意度调查对象为阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目的受益人, 实际发放问卷100份, 回收问卷100份, 受益对象的整体满意程度95%, 达到权重分值, 综上该项得分10分。	10.00	100.00%
总分		100	-	-	-	-	-	95.83	95.83%

附件二：满意度调查问卷报告

问卷调查背景

为客观评价2022年裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目整体实施情况，本次绩效评价指标体系中引入了“满意度”指标，评价组采用问卷方式对项目受益对象开展满意度调查。2022年该项目资金预算281万元，为客观反映该项目资金的使用实施情况及效果，评价组对阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目的受益人进行问卷调查。

2022年裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目的受益人

（二）调研内容

1	阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目采购的设备是否先进	是“	否“
2	阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目是否进行了公示	是“	否“

3	阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目是否及时处理生产线产生的垃圾	是“	否“
4	阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目能否为你带来收益	是“	否“
5	阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目是否带动了村集体收入	是“	否“
6	您是否满意阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目	满意“	不满意“
7	您对此项目是否有意见	是“	否“
8	其他意见或建议：		

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

到目前为止共回收问卷100份，其中有效问卷100份，有效问卷回收率为100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中K表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第i个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次2022年裕民县阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目受益人满意度问卷的信度为0.98。

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间。即 $-1 < r < +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $r = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $r = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < r < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < r < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < r < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < r < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < r < 1$ 为高度相关。

附件三：调查问卷的分析

1) 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目采购的设备是否先进

在100份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为89%，选否的比例为11%。

2) 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目是否进行了公示

在100份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为100%，选否的比例为0%。

3) 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目是否及时处理生产线产生的垃圾

在100份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为96%，选否的比例为4%。

4) 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目能否为你带来收益

在100份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为100%，选否的比例为0%。

5) 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目是否带动了村集体收入

在100份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为98%，选否的比例为2%。

6) 您是否满意阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目

在100份有效问卷中，被调查对象中选满意的比例为96%，
选不满意的比例为4%。

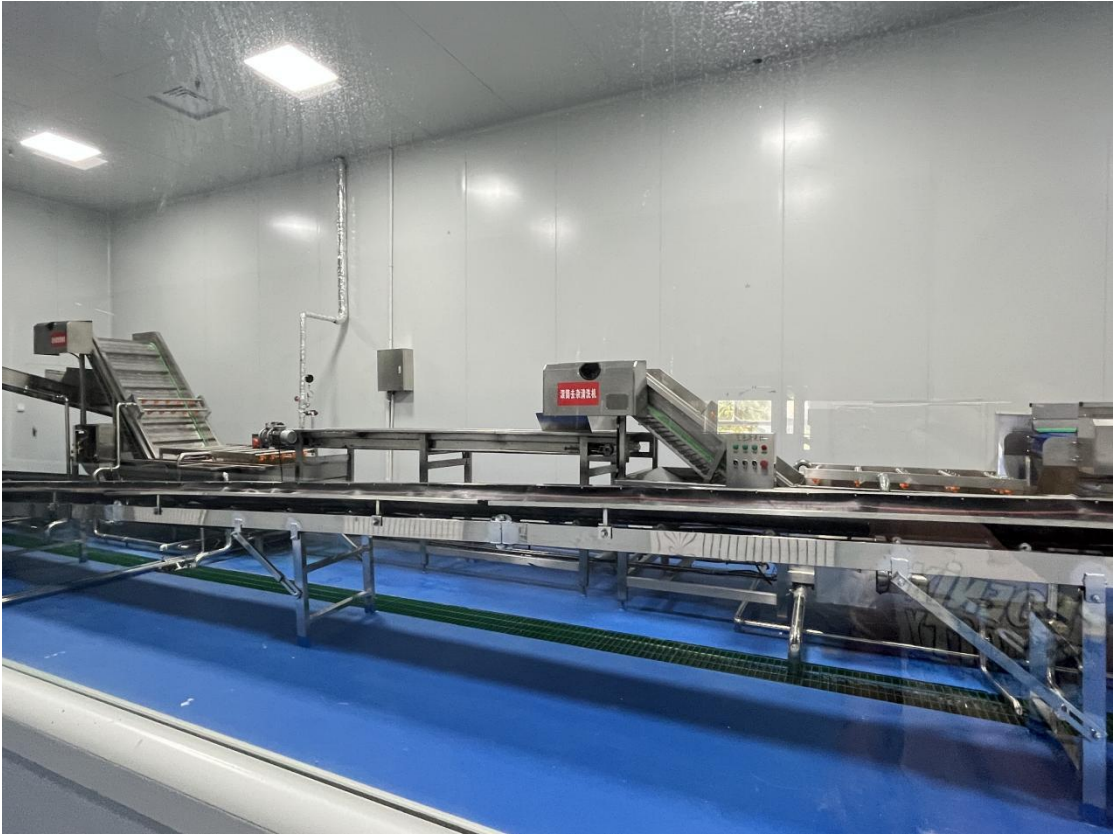
7) 您对此项目是否有意见

否

8) 其他意见或建议

无

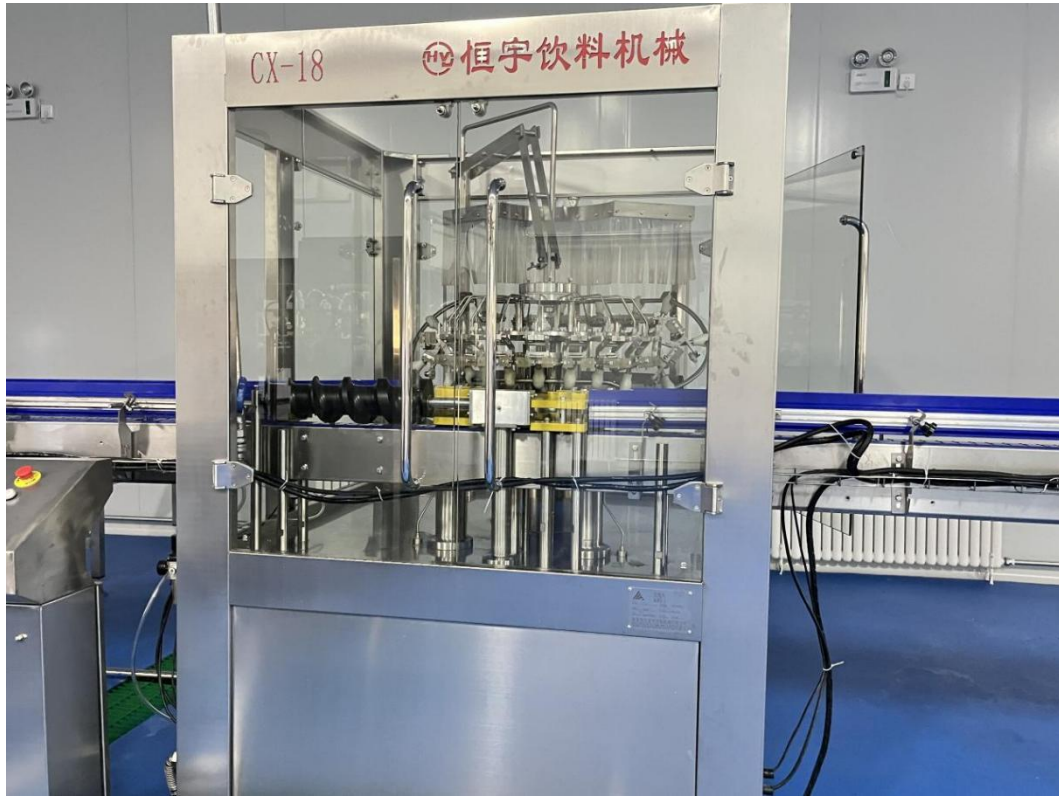
附件四：项目现场照片



















附件五：项目验收单

财政衔接补助资金项目验收单

项目名称：阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目

资金类型：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

验收日期：2023年4月19日

项目地点	项目批复建设内容	建设起止年限	资金数额	项目法人	备注
阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村	购置全套饮品及果酱生产线；购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、消毒锅、过滤器、传送带等相关配套附属设施	2022年5月-2023年4月	349.8	杨帆	跨年续建
项目实际建设内容					
验收评价	乡镇领导：  符合批复建设内容  县（市）乡村振兴局：   县（市）财政局： 符合项目数量及标准  	村组意见： 合格 符合标准 符合标准   施工方： 支秋卓 塞力克汗 
